



Allocatie 2.0 Tranche 3

Nazorgplan Centrale Programma

Versie Informatie

Versie	Datum	Bijzonderheden	Auteur
0.1	19-07-2024	Eerste versie gedeeld met MFF BAS	J. van Vilsteren
0.3	26-08-2024	Aangepaste versie	J. van Vilsteren
0.5	23-09-2024	Aangepaste versie	J. van Vilsteren
0.6	05-11-2024	Aangepaste versie	J. van Vilsteren
0.7	12-11-2024	Aangepaste versie	J. van Vilsteren
0.8	15-11-2024	Aangepaste versie	J. van Vilsteren
0.9	25-11-2024	Voorlopig definitieve versie	J. van Vilsteren
1.0	02-12-2024	Definitieve versie	J. van Vilsteren

Verspreiding

Versie	Datum	Naam	Bedrijf
0.1	19-07-2024	Lisa Sulkers, Mirjam van der Horst, Bram van Straalen	MFF BAS
0.3	26-08-2024	Jeroen Kok, Thijs Nijland, Marco Leensen, Ge Berkhoff	EDSN & Tennet
0.5	23-09-2024	KBG Transitie	Alle Marktrolle vertegenwoordigd in KBG Transitie
0.6	05-11-2024	KBG Transitie	Alle Marktrolle vertegenwoordigd in KBG Transitie
0.7	12-11-2024	KBG Transitie	Alle marktrolle vertegenwoordigd in KBG Transitie
0.8	15-11-2024	KBG Transitie	Alle marktrolle vertegenwoordigd in KBG Transitie
0.9	25-11-2024	IISO MFF BAS	Integraal Implementatie Stuur Orgaan MFF BAS
1.0	02-12-2024	Alle marktpartijen	Definitieve versie gepubliceerd op website MFF BAS

1 Inhoudsopgave

1	Inhoudsopgave	3
2	Nazorgplan Centrale Programma Allocatie 2.0 Tranche 2	4
2.1	Algemeen Allocatie 2.0 Tranche 2	4
2.2	Inleiding en achtergrond	4
2.3	Uitgangspunten	4
3	Nazorgproces.....	5
3.1	Betrokken marktpartijen en overlegorganen.....	5
3.2	Template Voortgangsrapportage	6
3.3	Niet tijdige aanlevering input	7
4	Planning	9

2 Nazorgplan Centrale Programma Allocatie 2.0 Tranche 3

2.1 Algemeen Allocatie 2.0 Tranche 3

Het Programma Allocatie 2.0 bestaat uit meerdere tranches om de veranderopgave voor de sector gecontroleerd en behapbaar te houden. Tranche 1 en Tranche 2 zijn reeds succesvol live gebracht, Tranche 3 - waarvoor dit document dient – betreft een Go Live moment, namelijk een functionele livegang van IC187, IC252, IC257, IC275, IC279, IC280L (kassabon) en RFCA2.0-6 op **1 januari 2025**.

2.2 Inleiding en achtergrond

Het Nazorgplan Centrale Programma Allocatie 2.0 Tranche 3 bevat een beschrijving van de door het centrale programma genomen maatregelen ten behoeve van de nazorg van de livegang van het project Allocatie 2.0 Tranche 3.

Het doel van dit Nazorgplan is het vastleggen van afspraken, waarmee de sector voorbereid is op de Nazorgperiode van het project.

Het Nazorgplan Centrale Programma Allocatie 2.0 Tranche 3 beschrijft niet de maatregelen die door LNB-E (Tennet) en RNBs (incl. EDSN) zijn genomen, als eigenaren van de marktfaciliterende systemen, waarop het project Allocatie 2.0 Tranche 3 nieuwe of gewijzigde functionaliteiten heeft geïmplementeerd.

2.3 Uitgangspunten


De volgende uitgangspunten zijn gedurende de Nazorgperiode van toepassing:

1. De IISO MFF BAS stuurt de uitvoering van dit Nazorgplan aan;
2. De IISO MFF BAS laat zich gedurende de Nazorgperiode adviseren door de KBG Transitie;
3. De KBG Transitie met afgevaardigde van iedere marktrol (LNB-E, RNB, FNB, LV, MV en PV/BRP) en wordt voorgezeten door Transitie Coordinator MFF BAS
4. Het Team Transitie (samenstelling conform het PCE Document) blijft eveneens actief gedurende de nazorgfase;
5. LNB-E, RNBs, FNB leveren gedurende de Nazorgperiode vanuit hun marktfaciliterende rol input aan bij de KBG Transitie over de stand van zaken op dat moment.

3 Nazorgproces

3.1 Betrokken marktpartijen en overlegorganen

Gedurende de Nazorgperiode zijn de volgende marktpartijen en overlegorganen betrokken KBG Transitie, Transitie Team, IISO MFF BAS en PF SG.

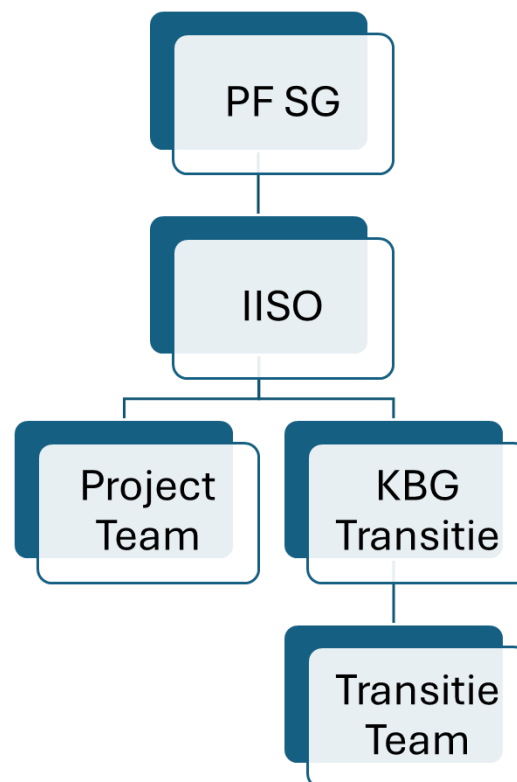

KBG Transitie

De Klankbordgroep Transitie is adviserend naar het IISO over transitie onderwerpen. Dit betreft enerzijds de transitie op marktafspraken en anderzijds de werkzaamheden onderdeel uitmakend van de technische transitie voor het beschikbaar stellen van functionaliteiten aan de markt.

In geval van een urgente bevinding wordt de IISO MFF BAS per mail op frequente basis op de hoogte gehouden van eventuele High- en Lowlights door de Transitie Manager MFF BAS. Tevens is het mogelijk om de IISO MFF BAS in geval van een urgente bevinding bijeen te brengen in geval er besluitvorming gewenst is.

Transitie Team

Het Transitie Team is het kernteam van de Klankbordgroep Transitie, dat zich bezighoudt met transitie activiteiten. Het Transitie Team levert input aan Klankbordgroep Transitie in geval van urgente bevindingen.

IISO MFF BAS

De IISO MFF BAS stuurt de maandelijkse (en in geval van een urgente bevinding frequentere) update van de KBG Transitie ter informatie naar de PF SG.

In geval van een urgente bevinding worden IISO en PF SG op frequentere wijze up to date gebracht.

PF SG

De PF SG voert regie over de algemene voortgang van het programma Allocatie 2.0 en wordt geïnformeerd door IISO MFF BAS over algemene voortgang tijdens Nazorgfase van het project Allocatie 2.0 Tranche 3.

3.2 Template Voortgangsrapportage

De input vanuit betrokkenen wordt middels onderstaand template op de hierboven beschreven momenten aangeleverd:

Voortgangsrapportage		Project A2.0 T3	Status Overall 	<<Datum>>	Marktrol LNB/RNB/FNB/ BRP/ LV/MV
Highlights (afgelopen twee weken) ➤ IC187 ➤ IC252 ➤ IC257 ➤ IC275 ➤ IC279 ➤ IC280L – Kassabon ➤ RFC A2.0-6		Lowlights (afgelopen twee weken) ➤ IC187 ➤ IC252 ➤ IC257 ➤ IC275 ➤ IC279 ➤ IC280L – Kassabon ➤ RFC A2.0-6		Activiteiten komende weken ➤ IC187 ➤ IC252 ➤ IC257 ➤ IC275 ➤ IC279 ➤ IC280L – Kassabon ➤ RFC A2.0-6	
Status		Toelichting		Kwalificatie en overige bijzonderheden	
Risico's / Issues					
				Hulpvraag	

Input voor deze maandelijkse voortgangsrapportage kan zijn:

- IC187 Bewaartermijnen Meetdata GV; Geen proces monitoring noodzakelijk
- IC252 Verreken Proces Meetfouten GV; met daarbij aandacht voor:
 - o aantal VVV,
 - o juistheid VVV en aantal afwijzingen VVV
 - o relatie met IC011b cases
- IC257 Settlement GV Elektriciteit Telemetrie; met daarbij aandacht voor:

- o Volledigheid en juistheid volumes voor reconciliatie en
- o Volledigheid en juistheid reconciliatieresultaten
- IC275 Settlement SMA; met daarbij aandacht voor:
 - o Volledigheid maandoorgangsstanden
 - o Volledigheid en juistheid volumes voor reconciliatie
 - o Volledigheid en juistheid reconciliatieresultaten
- IC279 Settlement Prijzen; monitoren op:
 - o Juistheid, volledigheid en tijdigheid van aangeleverde prijzen en eventuele afstemming en discussie als gevolg van deze publicatie
 - o Een jaarlijkse evaluatie van de weging van de settlement maandprijs, de realtime-energiewaarde in het tijdvak waar het volumeverschil betrekking op heeft, goed representeert.
- IC280L (Kassabon); monitoren op:
 - o Juistheid, volledigheid en tijdigheid van de door RNB op te leveren kassabon
- RFCA2.0-6 Optimalisatie controle meetgegevens; monitoren op:
 - o Aanleveren KW Max door MVs
- Nieuwe Issues / Bevindingen en Status bestaande Issues / Bevindingen
- Voortschrijdend inzicht
- Update kwalificatie MMC Hub ten behoeve van IC257/275 (LNB-E) en MES ten behoeve van IC252 (RNBs)
- Hulpvragen

Per marktrol op marktprocessen

Er wordt tevens een voortgang bewaakt op de specifieke marktprocessen per marktrol conform onderstaand overzicht.

Mijlpaal	Datum	Rapportage Over	Bevestiging Door	Opmerking
IC 252				
Laatste definitieve verekenvoorstel IC011B	FEB-2025	NB	BRP	
1 ^e VVV over 01/2025	FEB-2025	NB	LV	
IC 257 / IC275				
Volumes tbv voorlopige reconciliatie	MRT-2025	NB	BRP	
Voorlopige reconciliatie resultaten	MRT-2025	LNB	BRP	
Volumes tbv definitieve reconciliatie	JUN-2025	NB	BRP	
Definitieve reconciliatie resultaten	JUN-2025	LNB	BRP	
In- Excasso Factuur	JUL-2025	LNB	BRP	
IC 279				
Historische berekenen	FEB-2025	LNB		

3.3 Niet tijdige aanlevering input

Op het moment dat input vanuit marktrollen niet tijdig aangeleverd kan worden, dient dit zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk voor 16.00 uur van de desbetreffende dag, aangegeven te worden

bij de Transitie Manager MFF BAS. Dit zal dan tevens vermeld worden in de update aan IISO MFF BAS.

4 Planning

De Nazorgperiode voor het project Allocatie 2.0 Tranche 3 betreft de periode 1 januari tot 1 juli 2025.

Functionele Go Live	Startdatum Nazorg	Einddatum Nazorg
IC187, IC252, IC257, IC275, IC279, IC280L (Kassabon), RFCA2.0-6	1 januari 2025	1 juli 2025

De IISO MFF BAS behoudt zich het recht voor om de Nazorgperiode te verlengen tot uiterlijk 1 oktober 2025 in geval het project nog openstaande punten heeft die een succesvolle overdracht aan de beheerorganisaties in de weg staan. Indien de datum van 1 oktober 2025 overschreden dient te worden, dient hiervoor goedkeuring gevraagd te worden aan de PF SG.
