



Voorstel definitieve planning release januari 2026

t.b.v. ALV 2 juli 2026

v0.9



BAS B.V. / Juni 2025

Contactpersoon: Remco Rooswinkel (remco.rooswinkel@hetnormo.nl)


Scope release Januari 2026

De scope bestaat uit de volgende topics. Voor de topics 1 t/m 4 wordt een besluit gevraagd om de planning definitief te maken:

#	Topic #	Omschrijving	Collectief	Opmerkingen
1.	TS069	Registratie peer-to-peer handelaren	Energiewet	Deze topics kennen geen T0-T1 fase en met het vaststellen van de topicdocumenten start de bouwfase.
2.	TS070	Registratie van Energiegemeenschappen	Energiewet	
3.	TS005	Aanvullende klantdata	Energiewet	Delegatiegrondslag is opgenomen in de consultatieversie van de Energieregeling Algemeen. In de nota van toelichting van het Energiebesluit worden de gegevens benoemd. De uitwerking dient nog gedaan te worden door KGG. Verwachte inwerkingtreding is 1 januari 2026.
4.	TS079	Uitfaseren klantsleutel	n.v.t.	Het is mogelijk om variabel in te stappen. De klantsleutel wordt, na go-live, nog een halfjaar ondersteund waarbij er geen foutmelding wordt verstuurd.
5.	<i>TS023/TS060 (ter informatie)</i>	<i>Verbeteren registratie en uitwisseling naam aangeslotene (Tijdelijke oplossing bestandsuitwisseling)</i>	<i>Energiewet</i>	<i>Betreft tussentijdse oplossing voor de periode januari-april 2026 t.b.v. programma Meteruitwisseling (RDI).</i>

Invoeringsstrategie

De invoeringsstrategie geeft inzicht in de afhankelijkheden en deadlines voor invoering. Dit vormt de input voor de planningen. Vertraging in één van de topics (blokken) heeft geen impact op de planning van de overige topics.

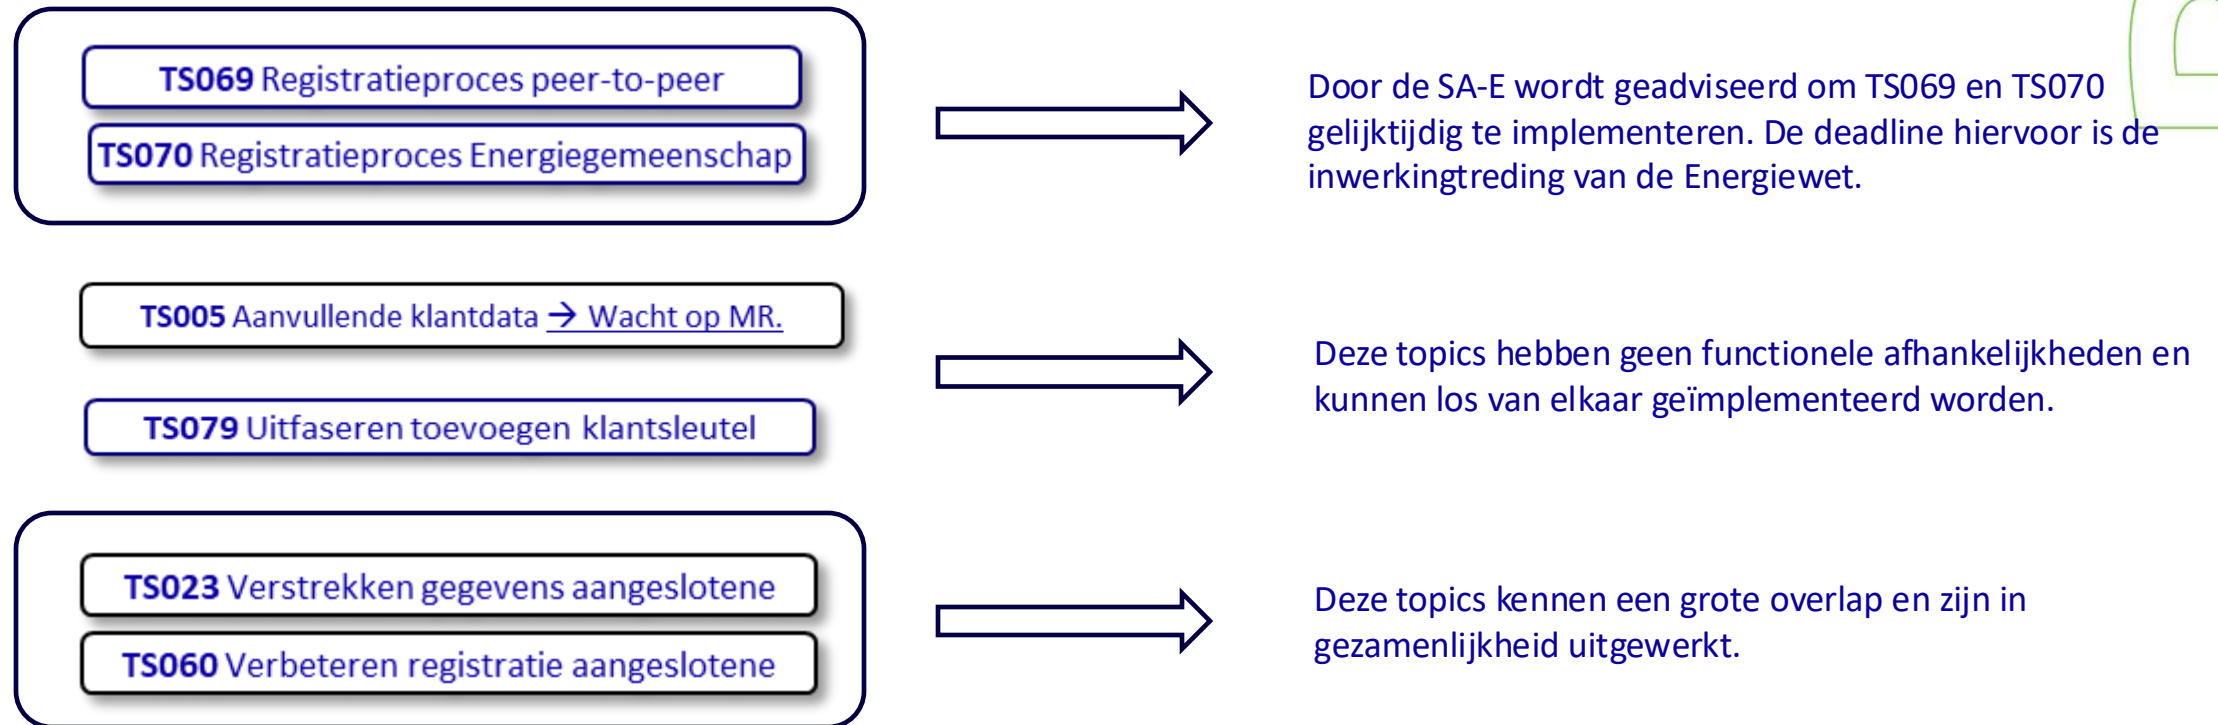

Impact implementatie

Korte samenvatting inzake de impact van de implementatie, fouten voorbehouden. Voor de volledige impact wordt verwezen naar de ingangsdokumentatie.

#	Topic#	Omschrijving	Impact	Geraakte marktrolle
1.	TS069	Registratie peer-to-peer handelaren	- Toevoegen van kenmerk in LV/DSB register	DSB, LV
2.	TS070	Registratie van Energiegemeenschappen	- Toevoegen van kenmerk in LV/DSB register	DSB, LV
3.	TS005	Aanvullende klantdata	- Toevoegen 2 velden aan excel template van TenneT, welke door de LV/ODA verwerkt moet kunnen worden.	TSB, LV
4.	TS079	Uitfaseren klantsleutel	- Uitzetten van berichtenverkeer	DSB/LV
5.	<i>TS023/060 (ter informatie)</i>	<i>Verbeteren registratie en uitwisseling naam aangeslotene - Deel A (Tijdelijke oplossing bestandsuitwisseling)</i>	<i>- Bestandsuitwisseling door LV aan RNB voor de periode januari/april.</i>	<i>LV/RNB</i>

Planning implementatie:

1. TS069 (Registratie peer-to-peer handelaren)
2. TS070 (Registratie van energiegemeenschappen)

T-moment	Activiteit	Datum	Doorlooptijd/Randvoorwaarde
T0	Topicdocumenten gereed	2 juli 2025 (ALV MFF)	
T1	Start bouw	2 juli 2025 (ALV MFF)	Zie opmerking 1
T1'	<i>Implementatieplan</i>	<i>10 september 2025</i>	
	Bouwfase doorlooptijd	2 juli – 28 november 2025	Ca. 4 maanden; Zie opmerking 2
T2	GAT	n.v.t.	Zie opmerking 3
	Uitvraag Go-live markt	Vrijdag 28 november	3 weken
	Besluit Go-live markt	Vrijdag 19 december	1 week
	Go-Live (functioneel)	Donderdag 1 januari	Zie opmerking 4
	Transitie	Na go-live	Zie opmerking 5

1. T0 en T1 op hetzelfde moment; Implementatieplan wordt op T1' opgeleverd.
2. Betreft alleen een aanpassing in het leveranciersregister (beheer door DSB).
3. GAT is niet nodig.
4. I.v.m. compliancy en klantafspraken dient de go-live datum op 1 januari te vallen.
5. Transitie kan pas na go-live plaatsvinden waarbij de LV het leveranciersregister kan aanpassen voor peer-to-peer en Energiegemeenschappen.

3. Planning implementatie TS005 (Aanvullende klantdata)

T-moment	Activiteit	Datum	Doorlooptijd/Randvoorwaarde
T0	Topicdocument gereed	20 december 2023	
T1	Ingangsdokumentatie gereed behalve MR Start bouw	1 augustus 2025	Afhankelijk van MR
	Bouwfase	1 augustus 2025 – 1 oktober 2025	2 maanden
T2	GAT	n.v.t.	
	Uitvraag Go-live markt	Vrijdag 28 november	3 weken
	Besluit Go-live markt	Vrijdag 19 december	1 week
	Go-Live (functioneel)	Donderdag 1 januari 2026	

- Format is afgestemd met TenneT. TenneT stelt een excel template ter beschikking op hun website waaraan 2 velden/kolommen worden toegevoegd.
- In de laatste versie van de MR Energiedata (jan. '25) lijkt het nog niet opgenomen. De gegevens zijn wel opgenomen in de nota van toelichting bij het Energiebesluit. De verwachting is dat dit is opgenomen in een MR die eind Q2 ter beschikking worden gesteld. Indien dit niet het geval, dan schuift dit topic door naar een volgende release.

4. Planning implementatie TS079 (Uitfaseren klantsleutel)

T-moment	Activiteit	Datum	Doorlooptijd/Randvoorwaarde
T0	Topicdocumenten gereed	2 juli 2025 (ALV MFF)	
T1	Implementatieplan gereed BS wordt aangepast Start bouw	10 september 2025 (ALV MFF)	
	Bouwfase doorlooptijd	10 september – 28 november	2,5 maand
T2	GAT	n.v.t.	
	Uitvraag Go-live markt	Vrijdag 28 november	3 weken
	Besluit Go-live markt	Vrijdag 19 december	
	Go-Live (functioneel) ³	Donderdag 1 januari 2026	

- LV kan aantal berichten niet meer versturen. De leveranciers kunnen nu al stoppen met het versturen van deze berichten en een groot aantal leveranciers zijn hier al mee gestopt.
- Na go-live van dit topic wordt nog een half jaar ondersteund dat er geen foutmelding wordt verstuurd als een leverancier de klantsleutel-administratie wil bijwerken. Indien de LV de klantsleutel dan nog niet heeft uitgefaseerd dan zal hij een foutmelding ontvangen als hij de klantsleutel-administratie wil bijwerken met nieuwe klantsleutels. Op dit moment leveren nog ca. 40 leveranciers klantsleutels aan.

5. TS023/060: Planning bestandsuitwisseling t.b.v. meterwissel programma (tussentijdse oplossing januari 2026 – april 2026)

T-moment	Activiteit	Datum	Doorlooptijd/Randvoorwaarde
T0	Topisdocument gereed	28 augustus 2025 (BOSO) 10 september 2025 (ALV MFF)	
T1	Bestandsdefinitie / business service gereed	28 augustus 2025 (BOSO) 10 september 2025 (ALV MFF)	
	Bouwfase doorlooptijd	1 oktober – 1 januari 2026	Ca. 13 weken
	Voorlichtingssessie/vragenuurtje testtraject	10 december	
	Proefrun bestanden	8 december – 12 december	
	Go-live	Maandag 5 januari 2026	

Ter informatie, nog niet ter besluitvorming
