



Planning Tranche 4 Allocatie 2.0

Versie 1.0 (definitief) na vaststelling PFSG op 11 oktober 2024



BAS B.V. / Oktober 2024

Contactpersoon: Remco Rooswinkel (remco.rooswinkel@mffbas.nl)

A2.0 Tranche 4 planningsoverleg:

- Gijsbert Steenaert (LNB)
- Olle Reijnders (LV)
- René Reinders (BRP)
- Rick Suurmond (RNB)
- Remco Rooswinkel (BAS)

Inleiding

- Op T0 is een initiële planning van Tranche 4 Allocatie 2.0 gecommuniceerd (zie sheet 9).
- Zoals in de notitie 'proces vaststellen implementatie Tranche 4' is afgesproken wordt deze initiële planning tussen T0 en T1 aangescherpt door het 'tranche 4 planningsoverleg'.
- In deze presentatie wordt de aangescherpte planning voor Tranche 4 Allocatie 2.0 gepresenteerd.
- Het goedkeuringstraject is als volgt doorlopen:
 - De 0.6 versie is gecommuniceerd naar de betrokken partijen ter review en ter advisering aan het IPPO.
 - In week 40 is de 0.8 versie goedgekeurd door het BOSO en het IISO, waarbij nog 1 tekstuele aanpassing heeft plaatsgevonden in voetnoot 2 op sheet 3.
- Op 11 oktober 2024 is de 0.9 versie vastgesteld door de PFSG.


Invoeringsstrategie

Gelijktijdig met Tranche 3¹:

TS044
Reclamatieproces (IC285)

¹ RfC-0190A2.0-TR3 TS044 In scope Tranche 3

Tranche 4-release (4 topics)²

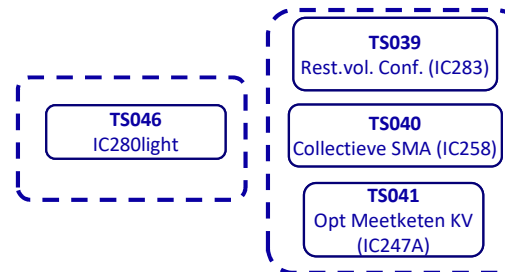

² IC280light en TS039/TS040/TS041 zijn niet aan elkaar gelinkt en hoeven niet gelijktijdig gereleased te worden.

Invoeringsmoment wordt later bepaald

TS045
Inf stroom interval Vol/AP (IC286)

TS045 kan pas afgerond worden zodra de MR beschikbaar is. Door deze afhankelijkheid kan de uitwerking vertraagd worden waardoor dit topic mogelijk pas na de Tranche-4 release wordt geïmplementeerd.

Planning implementatie Tranche 4

TS039/TS040/TS041 worden gelijktijdig live gebracht.

T-moment	Activiteit	Datum	Doorlooptijd/Randvoorwaarde
T0	Topicdocumenten gereed	26 april 2024 (PFSG)	
T1	Definitieve planning implementatie. Impactanalyse, CWV, BRS/BS/BD gereed en Start bouw	8 november 2024 (PFSG)	T0 – T1 = 6 maanden
T1'	<i>Uitloop voor T1</i>	<i>29 november 2024 (PFSG)</i>	<i>3 weken</i>
	Bouwfase doorlooptijd	11 november 2024 – 1 januari 2026	13,5 maanden
T2'	Start kopgroeptesten ¹	5 januari 2026	
	Kopgroeptesten	5 januari 2026 – 30 januari 2026	4 weken
T2	Start GAT	2 februari 2026	
	GAT ²	2 februari 2026 – 13 maart 2026	6 weken
	Uitvraag Go-live markt	13 maart 2026 – 3 april 2026	3 weken
	Besluit Go-live markt	10 april 2026 (PFSG)	1 week
	Go-Live (functioneel)³	Maandag 1 mei	1^e van de maand

¹ Aandachtspunt: Kopgroeptesten starten meteen na kerstreces, graag hiermee rekening houden in de planningen.

² Voor TS041 is een kwalificatie bij EDSN nodig. Deze kwalificatie vervangt de GAT voor dit topic.

³ Technische go-live wordt niet meer opgenomen in de sectorplanning.


Planning implementatie TS046 (IC280 light)

T-moment	Activiteit	Datum	Doorlooptijd/Randvoorwaarde
T0	Topicdocumenten gereed	26 april 2024 (PFSG)	
T1	Definitieve planning implementatie. Impactanalyse, CWV, BRS/BS/BD gereed en Start bouw	8 november 2024 (PFSG)	T0 – T1 = 6 maanden
T1'	<i>Uitloop voor T1</i>	<i>29 november 2024 (PFSG)</i>	<i>3 weken</i>
	Bouwfase doorlooptijd	11 november 2024 – 29 augustus 2025	9,5 maanden
	Back-end gereed voor kopgroep	29 augustus 2025	
T2'	Start kopgroeptesten	1 september 2025	
	Kopgroeptesten	1 september 2025 – 12 oktober 2025	6 weken ¹
	TQF gereed	1 december 2025	
	Kwalificatie	1 december 2025 – 10 maart	3,5 maanden ²
	Uitvraag Go-live markt	13 maart 2026 – 3 april 2026	3 weken
	Besluit Go-live markt	10 april 2026 (PFSG)	1 week
	Go-Live (functioneel)³	Maandag 1 mei	1^e van de maand

¹ Voor de kopgroeptesten worden 6 weken ingepland i.v.m. debuggen en hertesten.


² Gezien de scope en betrokken marktpartijen is de kwalificatie met 2,5 maand verkort t.o.v. normale periode.

³ Technische go-live wordt niet meer opgenomen in de sectorplanning.



Aandachtspunt (disclaimer) vanuit marktrol leverancier m.b.t. Tranche 4: Afhankelijkheid met Energiewet

- De scope van Tranche 4 topics IC-247A en IC258 en IC-286 wordt door leveranciers als te smal verondersteld om de gehele meet- en mutatieketen KV direct bij livegang van Tranche 4 op een toereikend niveau te laten functioneren.
- Om het risico te beperken dat er na livegang van A2.0 Tranche 4 een suboptimale en onwerkbaar situatie ontstaat, zijn flankerende topics benodigd die het omdraaien van de slimme meetketen onder de Energiewet verder faciliteren. Dit betreffen topics op het vlak van mutatie- en correctieprocessen, verrekenprocessen KV en beschikbaarheid/opvraagbaarheid van (historische) slimme- meterstanden.
- Deze nog uit te werken topics zijn gerelateerd aan de Energiewet en hebben met name een sterke afhankelijkheid van de nog op te leveren Ministeriele Regeling Meten.
- Het 6 maanden naar voren halen van implementatie Allocatie 2.0 Tranche 4, in combinatie met het (steeds) verder naar achteren schuiven van de MR Meten, vergroot de kans dat er niet tijdig functioneel en procesmatig invulling gegeven kan worden aan betreffende topics. Dit levert het nodige discomfort op bij de marktrol leverancier.
- Vooralsnog hoeft dit niet blocking te zijn voor de implementatie van Tranche 4 functionaliteit. Echter het tijdig identificeren, uitwerken en implementeren van betreffende topics wordt als randvoorwaardelijk geacht om succesvol technisch en functioneel live te gaan met Tranche 4 op 1 mei 2026.
- Indien hier niet aan voldaan kan worden bestaat de mogelijkheid dat conform de standaard procedure een RfC wordt ingediend om de implementatie uit te stellen.



Aandachtspunt: doorlooptijd kwalificatie IC280light

De doorlooptijd van IC280light is verkort naar 3,5 maanden met de volgende uitgangspunten :

- Aantal BRP-partijen groeit niet significant (bijv. n.a.v. inwerkingtreding Energiewet)
- Partijen zijn zich ervan bewust dat de kwalificatieperiode beperkt is en dienen zich hierdoor goed voor te bereiden:
 - Marktpartijen dienen zich tijdig in te lezen en voor te bereiden m.b.t. uitvoering van de kwalificatie.
 - Bij de kwalificatieperiode is het uitgangspunt genomen dat partijen op basis van 'zelf-service' de kwalificatie doorlopen. TenneT borgt dat de partijen via 'zelf-service' gelijktijdig kunnen kwalificeren, ondanks een beperkte beschikbaarheid van support resources.
 - Vanuit het IISO wordt toegezien op de voortgang van de voorbereiding van partijen.

BIJLAGE: INITIELE PLANNING ZOALS GECOMMUNICEERD OP T0



Initiële planning implementatie Tranche 4 (incl. IC280 light)

Deze planning is de initiële planning gebaseerd op een eerste inschatting van de betrokken marktrollen. De planning wordt tussen T0 en T1 getoetst en op T1 definitief gemaakt.

OUDE PLANNING

T-moment	Activiteit	Datum	Doorlooptijd/Randvoorwaarde
T0	Topicdocumenten gereed	26 april 2024 (PFSG)	
T1	Definitieve planning implementatie. Impactanalyse, CWV, BRS/BS/BD gereed en Start bouw	8 november 2024 (PFSG) ^{1 2}	T0 – T1 = 6 maanden
T1'	<i>Uitloop voor T1</i>	<i>29 november 2024 (PFSG)</i>	<i>3 weken</i>
	Bouwfase doorlooptijd	11 november 2024 – 1 april 2026	16,5 maanden
	Kwalificatie	1 april 2026 – 4 september 2026	5 maanden ³
T2'	Start kopgroep testen	4 mei 2026	4 weken na start kwalificatie
	Kopgroep testen	4 mei 2026 – 22 mei 2026	3 weken
T2	Start GAT	25 mei 2026	
	GAT	25 mei 2026 – 4 september 2026	6 weken + 1 week uitloop + zomervakantie
	Uitvraag Go-live markt	4 september 2026 – 25 september 2026	3 weken
	Besluit Go-live markt	9 oktober 2026 (PFSG)	2 weken
	Go-Live (technisch)	Weekend 24/25 oktober 2026	2 weken
	Go-Live (functioneel)	1 november 2026	

¹ BRS/BS/BD worden uiterlijk in september vastgesteld door de PFSG. De bouwfase kan dus al eerder starten. De periode van 6 maanden wordt gehandhaafd om mogelijke impact vanuit de Energiewet op de definitieve planning van Tranche 4 nog mee te kunnen nemen.

² Tussen T0 en T1 vindt een maandelijkse toetsing plaats op de haalbaarheid van deze planning. Op T1 wordt een definitieve planning gecommuniceerd.

³ Gezien de scope en betrokken marktpartijen is de kwalificatie met 1 maand verkort en loopt gelijk aan de GAT-periode.
