

Allocatie 2.0 Tranche 3

Fallbackplan

Versie	Auteur	Datum
1.0	J. van Vilsteren	21-06-2024

Versie informatie

Versie	Datum	Bijzonderheden	Auteur
0.1	29-03-2024	Eerste versie gedeeld met MFF BAS	J. van Vilsteren
0.3	11-04-2024	Aangepaste versie gedeeld met RNBs/EDSN, TenneT	J. van Vilsteren
0.5	13-05-2024	Aangepaste versie gedeeld met KBG Transitie	J. van Vilsteren
0.6	27-05-2024	Aangepaste versie aangeboden aan KBG Transitie	J. van Vilsteren
0.9	07-06-2024	Review KBG verwerkt, aanbieden IISO	J. van Vilsteren
0.91		Goedgekeurd IISO, aanbieden PFSG	J. van Vilsteren
1.0	21-06-2024	Vastgesteld PFSG	J. van Vilsteren

Verspreiding

Versie	Datum	Naam	Bedrijf
0.1	29-03-2024	MFF BAS	MFF BAS
0.3	11-04-2024	Projecten	MFF BAS, EDSN, TenneT TSO
0.5	13-05-2024	KBG Transitie	MFF BAS, EDSN, TenneT TSO
0.6	27-05-2024	KBG Transitie	Marktpartijen
0.9	07-06-2024	IISO	MFF BAS
0.91		PFSG	MFF BAS
1.0	21-06-2024	Publicatie op mijnMFFBAS	MFF BAS

1 Inhoudsopgave

1	Inhoudsopgave.....	3
2	Fallbackplan	4
2.1	Algemeen Allocatie 2.0 Tranche 3.....	4
2.2	Inleiding en achtergrond	4
2.3	Uitgangspunten.....	5
2.3.1	MFF BAS statuten	5
2.3.2	Minimale downtime systemen	5
2.3.3	Go live besluitvorming.....	5
2.3.4	Fallback besluitvorming.....	6
2.3.5	Visuele weergave Fallback en exit criteria toetsingsmomenten	7
2.3.6	Fallback besluitvorming.....	7
3	Uitvoering Werkzaamheden ten behoeve van Technische Go Live Allocatie 2.0 Tranche 3 Livegang 1 tot uiterlijk 6 december 2024	8
3.1.1	Toetsingsmoment entrycriteria en tevens startcall in geval van fallback: Vrijdag 13-12-2024; 10:00 uur door IISO.....	8
3.1.2	Besluitvorming exit criteria (1) - Eindcall Fallback Werkzaamheden: Maandag 16-12-2024; 09:00 uur door IISO.....	9
3.1.3	Besluitvorming exit criteria (2) - Eindcall Fallback Werkzaamheden: Vrijdag 20-12-2024; 09:00 uur door IISO.....	9
3.1.4	Besluitvorming exit criteria (3): Vrijdag 20-12-2024; 10:00 uur door PF SG	9
3.1.5	Scenario overzicht	10
4	Uitvoering Werkzaamheden ten behoeve van Functionele Go Live Allocatie 2.0 Tranche 2 Livegang 3 (1 januari 2025).....	11
4.1.1	Toetsingsmoment entrycriteria: Dinsdag 31-12-2024; 10:00 uur door IISO	11
4.1.2	Toetsingsmoment exitcriteria: Woensdag 01-01-2025; 10:00 uur door IISO.....	12
4.1.3	Scenario overzicht	12

2 Fallbackplan

2.1 Algemeen Allocatie 2.0 Tranche 3

Het Programma Allocatie 2.0 bestaat uit meerdere tranches om de veranderopgave voor de sector gecontroleerd en behapbaar te houden. Tranche 1 en Tranche 2 zijn reeds succesvol live gebracht in maart 2022 en april 2023.

Tranche 3 - waarvoor dit document dient – betreft een tweetal Go Live momenten, namelijk een technische en functionele livegang van de topics in scope van Allocatie 2.0 Tranche 3. De technische livegang betreft werkzaamheden die uitgevoerd worden tot **uiterlijk 13 december 2024** en een functionele livegang die plaatsvindt op **1 januari 2025**.

2.2 Inleiding en achtergrond

Het (overkoepelende) document Generieke Transitie Afspraken beschrijft alle aspecten van transitie. In deze generieke aanpak wordt verwezen naar een aantal deelproducten.

Een van deze deelproducten is het Fallbackplan. Dit bevat een beschrijving van de mogelijkheden en maatregelen om bij het niet-voldoen aan Acceptatie Criteria uiterlijk op 13 december 2024 en functionele livegang op 1 januari 2025 een ander scenario in werking te laten treden.

Het doel van dit document (Fallbackplan) is het vastleggen van afspraken, waarmee de sector voorbereid is op de te volgen Fallback scenario's indien de Go/No-Go criteria van de transitie niet worden behaald.

Dit document beschrijft voor het project Allocatie 2.0 Tranche 3, de afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de generieke afspraken. Voor de volledigheid worden zowel de generieke als specifieke afspraken in dit document beschreven.

Entry- en exitcriteria

De Fallback scenario's zijn uiteengezet per onderdeel van de transitie en worden toegelicht per Go/No-Go moment. Deze momenten - en de op die momenten te hanteren criteria - staan beschreven in de nog door IISO MFF BAS goed te keuren en door PFSG vast te stellen 'Entry- en exitcriteria Allocatie 2.0 Tranche 3'.

Communicatie- en Commandostructuur

Het nog door het IISO MFF BAS goed te keuren en door PFSG vast te stellen document 'Procesafspraken, Communicatie- en Commandostructuur (incl. issueproces) en Entry en Exit Criteria' bevat het proces en de Governance, die gevolgd dienen te worden bij het optreden van een probleem wat kan leiden tot een besluit voor één van de Fallback scenario's.

Implementatiescenario's

Het door de KBG Transitie nog uit te werken document 'Allocatie 2.0 Tranche 3 Implementatiescenario's' bevat denkbare scenario's, die zich kunnen voordoen betreffende de Go-Live. Het document verschaft duidelijkheid over welke stappen doorlopen dienen te worden op welk moment en door wie op het moment een dergelijk scenario in werking treedt.

Een tweetal voorbeelden van scenario's zijn:

- MMC HUB heeft een issue, TenneT Backend, ARM en MES systemen hebben geen issues
- MES Systeem heeft een issue, overige systemen hebben geen issue

Governance structuur Fallback scenario Allocatie 2.0 Tranche 3:

- De IISO MFF BAS neemt, indien op 13 december 2024 nog niet voldaan kan worden aan gestelde Acceptatie Criteria of de functionele livegang niet uitgevoerd kan worden per 1 januari, het besluit over het in werking treden van het Fallback scenario.
- Indien het fallback scenario (alsnog) niet het veronderstelde resultaat heeft dan vindt besluitvorming plaats volgens de geldende BAS statuten. De PFSG kan uiteindelijk besluiten tot een nieuwe datum voor Functionele Livegang.

2.3 Uitgangspunten

2.3.1 MFF BAS statuten

De statuten van MFF BAS bepalen dat gedurende de transitie periode, de besluitvorming bij de release puntsgewijs als volgt is:

1. Het IISO stuurt, in geval van een negatieve uitkomst tijdens de beslismomenten, de uitvoering van het Fallback plan aan; totdat de PFSG bijeen moet komen;
2. De IISO is bevoegd om te besluiten tot een Fallback.
3. De PF SG is bevoegd om te besluiten tot uitstel Go Live.

2.3.2 Minimale downtime systemen

Er is tijdens de Technische Go Live (TGL) en Functionele Go Live (FGL) geen downtime voor centrale systemen en processen.

2.3.3 Go live besluitvorming

De Klankbordgroep Transitie geeft minimaal een uur voordat een Go live besluit genomen gaat worden, een Go-live advies af aan het IISO.

- Gedurende de Go live besluitvorming toetst het IISO of aan de exit-criteria is voldaan, zoals is afgesproken binnen de 'Entry- & exitcriteria Transitie',
- Een onderdeel van de toetsing van de exit-criteria betreft de door de PF SG in April 2024 opnieuw vastgestelde Acceptatiecriteria T3',
- Indien voldaan aan de exitcriteria, is dus ook voldaan aan de acceptatiecriteria,
- Transitie Manager BAS is verantwoordelijk voor een tijdige aanlevering van advies namens de KBG Transitie aan het IISO,
- Op basis van advies neemt IISO een besluit en motiveert een eventuele afwijking van het advies.


2.3.4 Fallback besluitvorming

De scenario's zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Indien tijdens de IISO op 13 december 2024 blijkt dat er nog activiteiten uitgevoerd dienen te worden om aan de acceptatiecriteria te voldoen, dan treedt per direct het fallbackplan in werking.
- De door het IISO begeleide Fallback periode loopt tot maximaal vrijdag 20 december 2024 09:00 uur.
- Indien er dan nog geen oplossing gerealiseerd is, stopt de bevoegdheid van het IISO, en komt de PFSG op vrijdag 20 december 10:00 uur bijeen voor de vaststelling voor een Go Live of uitstel van Functionele Go Live. Het IISO komt voorafgaand uiterlijk vrijdag 20 december om 09:00 uur bijeen.
- In het geval dat tussen het laatste besluitmoment van het IISO op vrijdag 20 december om 09:00 en vrijdag 20 december om 10:00 uur alsnog een oplossing gerealiseerd wordt, is het de PFSG die het GO besluit zal geven op haar vergadering die start op vrijdag 20 december om 10.00 uur.
- Er is sprake van één Fallback periode met daarin een aantal toetsingsmomenten met betrekking tot de exit criteria ten behoeve van Go Live, voor het IISO.
- Op basis van de uitkomst van de Fallback periode voorafgaand aan het toetsingsmoment, wordt bepaald welk vervolg scenario in werking zal treden (Go Live of besluitvorming door de PF SG)
- De te beoordelen criteria tijdens een Go/no-Go moment staan benoemd in het document Entry- & exitcriteria Allocatie 2.0 Tranche 3
- Het IISO wordt voorafgaand aan de Go/no-Go momenten door de Klankbordgroep Transitie geïnformeerd over mogelijke issues vergezeld met een advies conform het issueproces zoals dat beschreven is in het document 'GTRA communicatie en commandostructuur en issueproces'.
- In geval dat de PF SG moet besluiten tot een Uitstel Livegang dan zullen de marktpartijen tijd nodig hebben om een Uitstel Livegang uit te voeren.

2.3.5 Visuele weergave Fallback en exit criteria toetsingsmomenten

In onderstaand overzicht staan de toetsingsmomenten en de verantwoordelijke organen weergegeven.

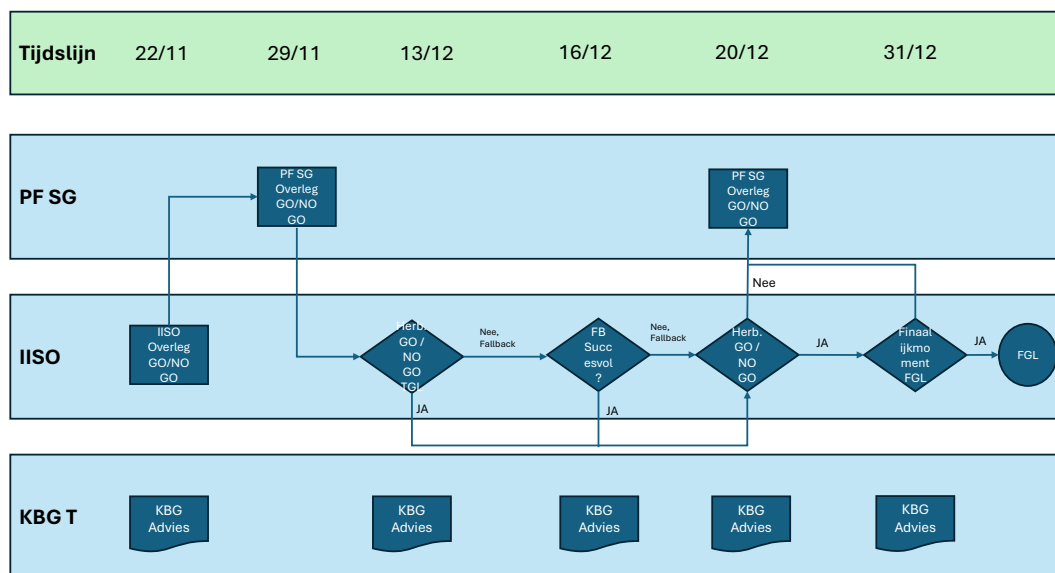

2.3.6 Fallback besluitvorming

Indien een Fallback langer duurt dan maandag 16 december 2024 10:00 uur, dient de IISO op maandag te besluiten tot:

- óf Go-live en dus het (deels) beschikbaar stellen van de systemen aan de markt,
- óf het doorvoeren van een Uitstel Functionele Go Live.

Dit Fallback plan focust zich op de Fallback periode die binnen de besluitvorming van het IISO valt, en geeft aan hoe de verantwoordelijkheid vervalt aan de PF SG.

3 Uitvoering Werkzaamheden ten behoeve van Technische Go Live Allocatie 2.0 Tranche 3 Livegang 1 tot uiterlijk 12 december 2024

Binnen het project Allocatie 2.0 Tranche 3 worden de software wijzigingen middels releases tot **uiterlijk 12 december 2024** gedeployed door Tennet en EDSN.

Het Go Live Window betreft een finale bevestiging tijdens de IISO MFF BAS op **vrijdag 13 december 2024 om 10:00 uur** door zowel EDSN (ARM, MES) als TenneT (MMC Hub, Backend) dat aan onderstaande acceptatiecriteria voor een succesvolle Functionele Livegang is voldaan. Indien dit niet het geval blijkt te zijn dan treedt direct het Fallbackplan in werking met een eerste verlenging tot **maandag 16 december 09:00 uur**.

Acceptatiecriteria Allocatie 2.0 Tranche 3:

- Vrijgave Advies GAT
- Market Readiness Go Live

Knock-out criteria:

- De MMC-Hub is (technisch en functioneel) gereed; er zijn geen (nieuwe) openstaande blokkerende of hoge bevindingen
- C-ARM is (technisch en functioneel) gereed; er zijn geen (nieuwe) openstaande blokkerende of hoge bevindingen

Geen knock-out criterium:

- MES is (technisch en functioneel) gereed; er zijn geen (nieuwe) openstaande blokkerende of hoge bevindingen.

Dit Go Live Window kent een Fallback scenario met voor het IISO een tweetal toetsingsmomenten. Daarna vindt besluitvorming plaats door de PFSG.

3.1.1 Toetsingsmoment entrycriteria en tevens startcall in geval van fallback: Vrijdag 13-12-2024; 10:00 uur door IISO

In de IISO op vrijdag 13 december 2024 bevestigt de IISO de succesvol uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van Allocatie 2.0 Tranche 3 op basis van het vrijgave advies dat gebaseerd is op de afgesproken en vooraf goedgekeurde entry & exit criteria.

Indien er een bevestiging van de Go wordt afgegeven zullen **op dinsdag 31 december 2024 tussen 10.00 uur en 23:59 uur** de zgn. toggles omgezet worden, zodat de software wijzigingen ten behoeve van Allocatie 2.0 Tranche 3 per **1 januari 2025 00:00 uur** beschikbaar gesteld worden aan de markt.

Indien er een No-Go wordt afgegeven treedt het fallbackplan per direct in werking, de fallbackperiode loopt in eerste instantie tot 16 december 2024 10.00 uur. De functionele Go Live blijft vooralsnog staan op **1 januari 2025**.

Deze call dient tevens als startcall om te starten met de benodigde werkzaamheden om te voldoen aan de gestelde acceptatiecriteria.

3.1.2 Besluitvorming exit criteria (1) - Eindcall Fallback Werkzaamheden: Maandag 16-12-2024; 09:00 uur door IISO

Indien in het IISO conform 'Besluitvorming Exit criteria' is besloten om het Fallback window in werking te laten treden, zal op maandag 16 december 2024 om 09:00 uur een nieuw toetsingsmoment plaatsvinden door het IISO. Op basis van de status van de uit te voeren werkzaamheden Allocatie 2.0 Tranche 3 kan één van de volgende scenario's in werking treden:

Go Live

Indien na de Fallback Werkzaamheden voldaan kan worden aan de acceptatiecriteria zal het Go Live scenario in werking treden. De functionele Go Live blijft na deze succesvolle uitvoer van werkzaamheden staan op **1 januari 2025**.

Uitstel

Indien de acceptatiecriteria tijdens de Eindcall Fallback Werkzaamheden op maandag 16-12-2024 09:00 uur niet behaald zijn, dan wordt de Fallback situatie gecontinueerd tot uiterlijk 20-12-2024 09:00 uur.

3.1.3 Besluitvorming exit criteria (2) - Eindcall Fallback Werkzaamheden: Vrijdag 20-12-2024; 09:00 uur door IISO

Indien in het IISO conform 'Besluitvorming Exit criteria' is besloten om het Fallback window in werking te laten treden, zal op maandag 16 december 2024 om 09:00 uur een nieuw toetsingsmoment plaatsvinden door het IISO. Op basis van de status van de uit te voeren werkzaamheden Allocatie 2.0 Tranche 3 kan één van de volgende scenario's in werking treden:

Go Live

Indien na de Fallback Werkzaamheden voldaan kan worden aan de acceptatiecriteria zal het Go Live scenario in werking treden. De functionele Go Live blijft na deze succesvolle uitvoer van werkzaamheden staan op **1 januari 2025**.

Uitstel

Indien de acceptatiecriteria tijdens de Eindcall Fallback Werkzaamheden op maandag 20-12-2024 09:00 uur niet behaald zijn, dan zal de besluitvorming over het te volgen scenario de verantwoordelijkheid worden van de PFSG. De Fallback situatie wordt gecontinueerd tot de vergadering van de PFSG om 10.00 uur.

3.1.4 Besluitvorming exit criteria (3): Vrijdag 20-12-2024; 10:00 uur door PF SG

Op vrijdag 20 december 2024 om 10:00 uur neemt de PFSG besluitvorming t.a.v. Uitstel Livegang, over van het IISO. De PFSG overlegt en besluit welk scenario gevolgd zal worden.

3.1.5 Scenario overzicht

In onderstaande tabel is aangegeven welke scenario's mogelijk zijn en wanneer deze kunnen optreden, als ook wie verantwoordelijk is voor de besluitvorming daaromtrent.

Scenario	Wanneer	Wie besluit	Mogelijk vervolg scenario
Besluitvorming entry criteria	Vr 13-12-2024 10:00	PF SG	Go live of Aanvang Fallback Werkzaamheden
Besluitvorming exit criteria (1)	Ma 16-12-2024 10:00	IISO	Einde Fallback Werkzaamheden; Go live, Verlenging Fallback of Uitstel Livegang
Besluitvorming exit criteria (2)	Vr 20-12-2024 09:00	IISO	Einde Fallback Werkzaamheden; Go live of Uitstel Livegang
Besluitvorming (definitief)	Vr 20-12-2024 10:00	PF SG	Go Live of Uitstel Livegang

4 Uitvoering Werkzaamheden ten behoeve van Functionele Go Live Allocatie 2.0 Tranche 2 Livegang 3 (1 januari 2025)

Binnen het project Allocatie 2.0 Tranche 3 vindt het Go Live Window (automatisch omzetten van een zgn. toggle) plaats op dinsdag 31 december 2024 van 10:00 uur tot 00:00 uur.

Voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden vindt er op **vrijdag 31 december 2024 om 10:00 uur** een herbevestiging van de Functionele Go Live plaats op basis van de afgesproken entry criteria. Aansluitend aan de uit te voeren werkzaamheden vindt communicatie plaats op basis van de afgesproken exit criteria.

4.1.1 Toetsingsmoment entrycriteria: Dinsdag 31-12-2024; 10:00 uur door IISO

In het IISO op dinsdag 31 december 2024 om 10:00 uur herbevestigt het IISO voor de start van de uit te voeren werkzaamheden van Allocatie 2.0 Tranche 3 op basis van het vrijgave advies dat gebaseerd is op de afgesproken en vooraf Goedgekeurde entry & exit criteria.

Uitgangspunt hierbij is een ongewijzigde situatie – er zijn geen wijzigingen meer doorgevoerd in de centrale systemen - sinds de door de PF SG gegeven Go Live op basis van het behalen van een positief advies van het IISO op de volgende criteria:

- Vrijgave Advies GAT
- Market Readiness Go Live

Knock-out criteria:

- De MMC-Hub is (technisch en functioneel) gereed; er zijn geen (nieuwe) openstaande blokkerende of hoge bevindingen
- C-ARM is (technisch en functioneel) gereed; er zijn geen (nieuwe) openstaande blokkerende of hoge bevindingen

Geen knock-out criterium:

- MES is (technisch en functioneel) gereed; er zijn geen (nieuwe) openstaande blokkerende

Happy Flow: Indien er een bevestiging van de Go wordt afgegeven worden de reeds tot en met uiterlijk 6 december 2024 (of gedurende Fallbackperiode technische Go Live) geïmplementeerde technische wijzigingen functioneel live gebracht op **dinsdag 31 december 2024 tussen 10:00 en 00:00 uur**.

Unhappy Flow: Indien er een No-Go wordt afgegeven, treedt direct het Uitstel Livegang scenario in werking en zal de PF SG MFF BAS zich direct buigen over een nieuwe datum voor Livegang Allocatie 2.0 Tranche 3. De PFSG wordt geïnformeerd per direct bijeen te komen.

4.1.2 Toetsingsmoment exitcriteria: Woensdag 01-01-2025; 10:00 uur door IISO

Go Live

Indien de werkzaamheden ten behoeve van de FGL succesvol zijn uitgevoerd, i.e. aan de exitcriteria is voldaan, zal het Go Live scenario in werking treden, cf. het nog op stellen integrale draaiboek om vervolgens over te gaan in de Nazorgfase.

Indien de werkzaamheden ten behoeve van de FGL onsuccesvol zijn uitgevoerd, i.e. aan de exitcriteria is (nog) niet voldaan, zal dit tijdens de Nazorgfase conform gemaakte afspraken in het nog op te stellen Nazorgplan opgepakt worden.

4.1.3 Scenario overzicht

In onderstaande tabel is aangegeven welke scenario's mogelijk zijn en wanneer deze kunnen optreden, als ook wie verantwoordelijk is voor de besluitvorming daaromtrent.

Scenario	Wanneer	Wie besluit	Mogelijk vervolg scenario
Besluitvorming entry criteria	Di 31-12-2024 10:00	IISO	Go of Besluitvorming Uitstel Livegang naar PF SG
Besluitvorming exit criteria	Wo 01-01-2025 10:00	IISO	Go Live en aanvang Nazorgfase, terugkoppeling naar PF SG
