



Allocatie 2.0 Tranche 2

Fallbackplan

Versie Informatie

Versie	Datum	Bijzonderheden	Auteur
0.1	13-07-2022	Eerste versie gedeeld met MFF BAS	J. van Vilsteren
0.3	20-07-2022	Aangepaste versie gedeeld met pRO, EDSN, Tennet TSO	J. van Vilsteren
0.4	17-08-2022	Aangepaste versie gedeeld met pRO, EDSN, Tennet TSO en MFF BAS	J. van Vilsteren
0.5	23-08-2022	Aangepaste versie aangeboden aan KBG Transitie	J. van Vilsteren
0.55	02-09-2022	Aangepaste versie aangeboden aan KBG Transitie	J. van Vilsteren
0.6	19-09-2022	Review KBG verwerkt, aanbieden SI	J. van Vilsteren
0.9	23-09-2022	Goedgekeurd SI, aanbieden SSG MFF BAS	J. van Vilsteren
1.0	28-09-2022	Vastgesteld SSG MFF BAS	J. van Vilsteren
1.1	03-02-2023	Herziene versie op basis van Go Live Draaiboek	J. van Vilsteren
1.2	14-02-2023	Herziene versie op basis van input SI MFF BAS	J. van Vilsteren
2.0	21-02-2023	Vastgesteld door SSG	J. van Vilsteren
2.1	09-03-2023	Aangepaste versie op basis van Draaiboek	J. van Vilsteren
2.2	14-03-2023	Aangepaste versie obv Draaiboek	J. van Vilsteren
2.5	18-03-2023	Goedgekeurd door SI, gepubliceerd op MijnMFFBAS	L. Sulkers

Verspreiding

Versie	Datum	Naam	Bedrijf
0.1	14-07-2022	MFF BAS	MFF BAS
0.3	20-07-2022	Projecten & Beheer	MFF BAS, pRO, EDSN, Tennet TSO
0.5	23-08-2022	KBG Transitie	Marktpartijen
0.55	02-09-2022	KBG Transitie	Marktpartijen
0.6	06-09-2022	SI	MFF BAS
0.99	20-09-2021	SSG	MFF BAS
1.0	18-10-2022	Publicatie op mijnMFFBAS	MFF BAS
1.1	03-02-2023	SI	MFF BAS
1.2	14-02-2023	SI	MFF BAS
2.0	14-02-2023	SSG	MFF BAS

2.1	10-03-2023	SI	MFF BAS
2.2	14-03-2023	SSG	MFF BAS
2.5	18-03-2023	Publicatie op MijMFFBAS	MFF BAS

1 Inhoudsopgave

1	Inhoudsopgave	3
2	Fallbackplan	4
2.1	Algemeen Allocatie 2.0 Tranche 2	4
2.2	Inleiding en achtergrond	4
2.3	Uitgangspunten	5
2.3.1	MFF BAS statuten	5
2.3.2	Minimale downtime systemen.....	5
2.3.3	Go live besluitvorming.....	6
2.3.4	Fallback besluitvorming.....	6
2.3.5	Visuele weergave fallback en exit criteria toetsingsmomenten	7
2.3.6	Fallback besluitvorming.....	7
2.3.7	Fallback	7
2.4	Deployment Releases Allocatie 2.0 Tranche 2 Livegang 1 17-19 maart 2023.....	7
2.4.1	Toetsingsmoment entrycriteria: Vrijdag 17-03-2023; 10:00 uur door SI	7
2.4.2	Toetsingsmoment exit criteria (1): Zaterdag 18-03-2023; 17:30 uur door SI	8
2.4.3	Toetsingsmoment exit criteria (2): Zondag 19-03-2023; 08:00 uur door SI	9
2.4.4	Toetsingsmoment exit criteria (3): Zondag 19-03-2023; 16:00 uur door SI	9
2.4.5	SSG besluitvorming.....	10
2.4.6	Scenario overzicht	11
2.5	Deployment Releases Allocatie 2.0 Tranche 2 Livegang 2 (31 mrt tot 2 april 2023) .	12
2.5.1	Toetsingsmoment entrycriteria: Vrijdag 31-03-2023; 10:00 uur door SI	12
2.5.2	Scenario overzicht	12

2 Fallbackplan

2.1 Algemeen Allocatie 2.0 Tranche 2

Het Programma Allocatie 2.0 bestaat uit meerdere tranches om de veranderopgave voor de sector gecontroleerd en behapbaar te houden. Tranche 1 is reeds succesvol live gebracht in maart 2022, tranche 2 - waarvoor dit document dient – betreft een tweetal Go Live momentum, namelijk een functionele en technische livegang van IC253 en technische livegang van IC256, IC273 en IC276 in het weekend van **17 tot en met 19 maart 2023** en een functionele livegang van issues IC256, IC273 en IC276 op **1 april 2023**.

2.2 Inleiding en achtergrond

Het (overkoepelende) document Generieke TRansitie Afspraken beschrijft alle aspecten van transitie. In deze generieke aanpak wordt verwezen naar een aantal deelproducten.

Een van deze deelproducten is het Fallbackplan. Dit bevat een beschrijving van de mogelijkheden en maatregelen om bij een niet-succesvolle technische of functionele livegang in het weekend van 19 maart 2023 en functionele livegang op 1 april 2023 een ander scenario in werking te laten treden.

Het doel van dit document (Fallbackplan) is het vastleggen van afspraken, waarmee de sector voorbereid is op de te volgen fallback scenario's indien de Go/No-Go criteria van de transitie niet worden behaald.

Dit document beschrijft voor het project Allocatie 2.0 Tranche 2, de afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de generieke afspraken. Voor de volledigheid worden zowel de generieke als specifieke afspraken in dit document beschreven.

Entry- en exitcriteria

Het fallback scenario is uiteengezet per onderdeel van de transitie en worden toegelicht per Go/No-Go moment. Deze momenten - en de op die momenten te hanteren criteria - staan beschreven in de vastgestelde 'Entry- en exitcriteria Allocatie 2.0 Tranche 2', onderdeel van het PCE document v1.0.

Communicatie- en Commandostructuur

Het door de SI MFF BAS vastgestelde document vastgestelde 'Procesafspraken, Communicatie- en Commandostructuur (incl. issueproces) en Entry en Exit Criteria' bevat het proces en de governance, die gevolgd dienen te worden bij het optreden van een probleem wat kan leiden tot een besluit voor één van de fallback scenario's.

Implementatiescenario's

Het door de KBG Transitie nog uit te werken document 'Allocatie 2.0 Tranche 2 Implementatiescenario's' bevat scenario's welke door KBG Transitie als mogelijk worden geacht, waarbij het document duidelijkheid verschaft welke stappen doorlopen dienen te worden op welk moment en door wie op het moment een dergelijk scenario in werking treedt.

Een tweetal voorbeelden van scenario's zijn:

- MMC HUB heeft een issue, EDSN systemen hebben geen issues
- C-AR PUD heeft een issue, overige systemen hebben geen issue

Governance structuur Fallback scenario Allocatie 2.0 Tranche 2:

- De Stuurgroep Implementatie (SI) MFF BAS neemt, indien de deployment niet binnen het geplande window wordt behaald, het besluit voor het in werking treden van het fallback scenario. De Sector Stuurgroep (SSG) wordt direct per mail geïnformeerd over dit besluit.
- Indien de deployment niet gehaald wordt gedurende de fallback dan vindt besluitvorming plaats volgens de geldende BAS statuten. De SSG kan besluiten tot voortzetting van de fallback of tot een rollback.

2.3 Uitgangspunten

2.3.1 MFF BAS statuten

De statuten van MFF BAS bepalen dat gedurende de deployment periode, de besluitvorming bij de release puntsgewijs als volgt is:

1. De SI stuurt, indien het deploymentwindow niet toereikend is, de uitvoering van het fallback plan aan; totdat de SSG bijeen moet komen;
2. De SSG is bevoegd om te besluiten tot een fallback.

2.3.2 Minimale downtime systemen

Generiek uitgangspunt is dat de centrale systemen (CAR Portaal, C-ARM, PROFRA/EDSN en MMC Hub/Tennet TSO) minimale onbeschikbaarheid hebben, zodat marktpartijen maximaal in staat gesteld worden hun processen uit te kunnen voeren. Daarom worden voor de deployment- en fallbackperiode de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- a) Indien de release het - op basis van risico-afweging - toelaat om op de zaterdag binnen de standaard onderhoudsrelease afspraken (tussen 9:00 en 20:00) te deployen, wordt het reguliere release window gebruikt. De commerciële partijen hebben op zaterdagochtend normaliter hun helpdesks open of voeren een shop-in-shop principe. Voor een sectorrelease kan hiervan worden afgeweken door de SI, bijvoorbeeld om risico's te minimaliseren.
- b) Een eventuele fallback periode aansluitend aan de deployment waarbinnen de SI een besluit kan nemen tot Go Live, zal niet later dan zondag 18:00 eindigen. In geval van een succesvolle fallback blijft er dan voldoende doorlooptijd beschikbaar om reguliere batch jobs af te ronden voor 06:00 maandag ochtend, waardoor de marktpartijen in staat gesteld worden hun reguliere processen zonder vertraging uit te voeren.

2.3.3 Go live besluitvorming

Het transitie- en deployment team geeft een uur voordat een Go live besluit genomen gaat worden, een go-live advies af aan de SI.

- Gedurende de Go live besluitvorming toetst de SI of aan de exit criteria is voldaan, zoals is afgesproken binnen de 'Entry- & exitcriteria Transitie',
- Een onderdeel van de toetsing van de exit-criteria betreft de door de SSG in september 2022 opnieuw vastgestelde Acceptatiecriteria Releases.
- Indien voldaan aan de exitcriteria, is dus ook voldaan aan de acceptatiecriteria.
- Op basis van advies neemt SI een besluit en motiveert een eventuele afwijking van het advies.

2.3.4 Fallback besluitvorming


De scenario's zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- De door de SI begeleide fallback periode loopt tot maximaal zondag 18:00 uur. Indien er dan nog geen oplossing gerealiseerd is stopt de bevoegdheid van de SI, en komt de SSG op maandag 10:00 uur bijeen voor de vaststelling voor een Go Live, voortzetting van de Fallback of een Rollback. De SI komt voorafgaand uiterlijk zondag 17:00 uur bijeen.
- In het geval dat tussen het laatste besluitmoment van de SI op zondag 17:00 en maandag 10:00 uur alsnog een oplossing gerealiseerd wordt, is het de SSG die het GO besluit zal geven op haar vergadering die start op maandag om 10.00 uur.
- Er is sprake van één fallback periode met daarin een aantal toetsingsmomenten met betrekking tot de exit criteria ten behoeve van Go Live, voor de SI.
- Op basis van de uitkomst van de fallback periode voorafgaand aan het toetsingsmoment, wordt bepaald welk vervolg scenario in werking zal treden (Go Live, Rollback of besluitvorming door de SSG)
- De te beoordelen criteria tijdens een go/no-go moment staan benoemd in het document Entry- & exitcriteria Allocatie 2.0 Tranche 2
- De SI wordt vooraf aan de go/no-go momenten door de Klankbordgroep Transitie geïnformeerd over mogelijke issues vergezeld met een advies conform het issueproces zoals dat beschreven is in het document 'GTRA communicatie en commandostructuur en issueproces'.
- In geval dat de SSG moet besluiten tot een fallback dan zullen de decentrale marktpartijen tijd nodig hebben om een fallback uit te voeren; Uitgangspunt is dat decentrale marktpartijen een fallback kunnen uitvoeren binnen het centrale fallback window.

LET OP: na het Go Live weekend van 18 maart 2023 gaat enkel IC253 functioneel live. De overige functionaliteiten staan klaar om per 1 april 2023 in gebruik genomen te gaan worden. Deze bijzondere situatie dient meegewogen te worden in de verdere detailuitwerking van mogelijke implementatie scenario's door Klankbordgroep Transitie.

2.3.5 Visuele weergave fallback en exit criteria toetsingsmomenten

In onderstaand overzicht staan de toetsingsmomenten en de verantwoordelijke organen weergegeven.

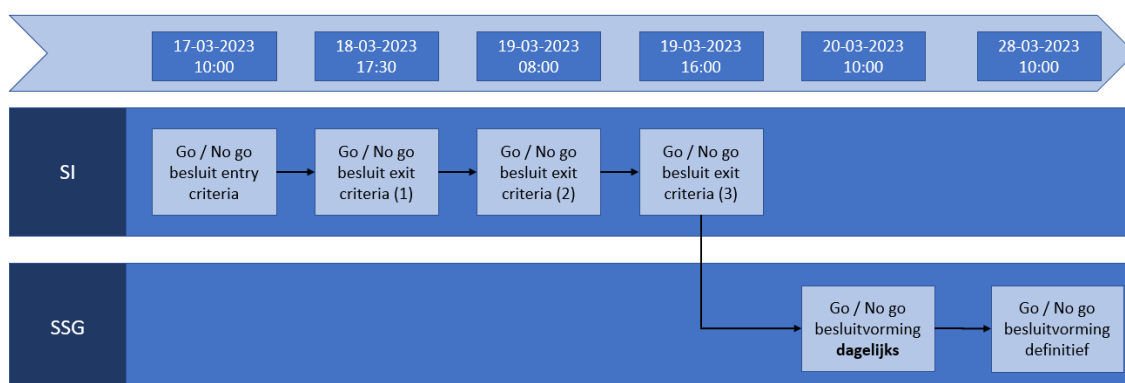

2.3.6 Fallback besluitvorming

Indien een fallback langer duurt dan zondag 18:00, dient de SSG op maandag te besluiten tot:

- óf go-live en dus het (deels) beschikbaar stellen van de systemen aan de markt,
- óf een verlenging van de fallback (voor een deel van de systemen),
- óf het doorvoeren van een rollback.

Dit fallback plan focust zich op de fallback periode die binnen de besluitvorming van de SI valt, en geeft aan hoe de verantwoordelijkheid vervalt aan de SSG.

2.3.7 Fallback

Indien het rollback scenario in werking treedt zal er een nieuw deployment window worden ingepland, met de daarbij horende rollback scenario's zoals besproken in dit document. In de volgende paragrafen wordt ieder entry & exit moment verder toegelicht.

2.4 Deployment Releases Allocatie 2.0 Tranche 2 Livegang 1 17-19 maart 2023

Binnen het project Allocatie 2.0 Tranche 2 vindt het Go Live Window plaats op zaterdag 18 maart 2023 van 09:00 tot 20:00 uur. Dit Go Live Window kent een fallback scenario met voor de SI een aantal toetsingsmomenten. Daarna vindt besluitvorming plaats door de SSG.

Voorafgaand aan de deployment vindt een besluitvorming plaats op basis van de afgesproken entry criteria. Aansluitend aan de deployment of een fallback window, vindt besluitvorming plaats op basis van de afgesproken exit criteria.

2.4.1 Toetsingsmoment entrycriteria: Vrijdag 17-03-2023; 10:00 uur door SI

In de SI op vrijdag 17 maart besluit de Stuurgroep voor de start van de deployment van Allocatie 2.0 Tranche 2 op basis van het vrijgave advies dat gebaseerd is op de afgesproken en vooraf goedgekeurde entry & exit criteria.

Uitgangspunt hierbij is een ongewijzigde situatie – er zijn geen wijzigingen meer doorgevoerd in de centrale systemen - sinds de door de SSG gegeven Go Live op basis van het behalen van een positief advies van de SI op de volgende criteria:

- Positief advies Kopgroep
- Positief advies GAT
- 100% market readiness voor markttrollen LNB-E, RNB en FNB
- 66% market readiness per betrokken marktrol (m.u.v. de marktrol RNB en de marktrol LNB-E) op het moment van MFF BAS go-live besluitvorming
- 100% market readiness voor tenminste 2 deelnemende leveranciers voor de aanlevering van geaggregeerde datasets ten behoeve van de berekening van dynamische profiel fracties
- Succesvolle kwalificatie van tenminste 2 deelnemende leveranciers voor de aanlevering van geaggregeerde datasets ten behoeve van de berekening van dynamische profiel fracties
- Positief advies in beheername

Indien er een bevestiging van de Go wordt afgegeven zal er **op zaterdag 18 maart 2023 om 09:00 uur** worden gestart met de deployment. Indien er een No-go wordt afgegeven zal de start van de deployment met 1 week verschuiven naar het weekend van **24 t/m 26 maart 2023**. De functionele Go Live van IC256, IC273 en IC276 blijft na deze succesvolle deployment staan op **1 april 2023**.

Indien de deployment in het weekend van 24 t/m 26 maart toch niet mogelijk blijkt te zijn dan zal de start van de deployment met 1 maand worden uitgesteld **naar 15 april 2023**, dit betreft de technische Go Live van alle issues en de functionele Go Live van IC253. De functionele Go Live van IC256, IC273 en IC276 verplaatst automatisch naar **1 mei 2023**.

2.4.2 Toetsingsmoment exit criteria (1): Zaterdag 18-03-2023; 17:30 uur door SI

Het eerste exit criteria toetsingsmoment go/no go vindt plaats op zaterdag 18 maart 2023 om 17:30 uur. Op basis van de status van de software deployment Allocatie 2.0 Tranche 2 kan één van de volgende scenario's in werking treden:

Go Live

Indien de software succesvol is uitgerold, i.e. aan de exitcriteria is voldaan, zal het Go Live scenario in werking treden. De systemen worden weer beschikbaar gesteld voor de sector op zaterdag 18-03-2023 **om 20:00 uur**.

Fallback window: (16 uur verlenging)

Indien de exit criteria tijdens het Go/No-Go moment op zaterdag 18-03-2023 17:30 uur niet behaald zijn of lijken te gaan worden, dan heeft de SI de mogelijkheid om:

- Het go-live moment voor Allocatie 2.0 Tranche 2 met 16 uur uit te stellen. Het nieuwe go-live moment wordt: zondag 19-03-2023 11:00 uur. Het volgende toetsmoment door de SI wordt gepland op 19-03-2023 om 08:00 uur.

Impact

- a. Als C-ARM langere tijd offline is, wordt de weekend allocatie later opgeleverd.
- b. Indien er sprake is van uitstel, ontstaat er mogelijk ook ergens een ophoping van berichten. Hier zullen we ook rekening mee moeten houden.

2.4.3 Toetsingsmoment exit criteria (2): Zondag 19-03-2023; 08:00 uur door SI

Indien in de SI conform 'Besluitvorming Exit criteria' is besloten om het fallback window in werking te laten treden, zal op zondag 19 maart 2023 om 08:00 uur een nieuw toetsingsmoment plaatsvinden door de SI. Op basis van de status van de software deployment Allocatie 2.0 Tranche 2 kan één van de volgende scenario's in werking treden:

Go Live

Indien de software na fallback window 1 succesvol is uitgerold zal het Go Live scenario in werking treden. De systemen worden weer beschikbaar gesteld voor de sector op 19-03-2023 om 11:00 uur.

Fallback window verlengen (9 uur verlenging)

Indien de exit criteria tijdens het tweede toetsingsmoment op zondag 19-03-2023 **08:00 uur** niet behaald zijn of lijken te gaan worden, dan heeft de SI de mogelijkheid om:

- Het Go Live moment nogmaals 10 uur uit te stellen. De fallback loopt door tot het volgende toetsingsmoment dat middels een conference call wordt ingepland op zondag 19-03-2022 om 16:00 uur. In geval van het succesvol doorlopen van de entry criteria, zal de Go Live en dus de openstelling van de systemen aan de markt, om 19:00 uur plaatsvinden.
- Indien het besluitvormingsmoment van 08:00 uur daar aanleiding toe geeft, kan er afgesproken worden om eerder dan 16:00 uur een call te beleggen, mits het vrijgave advies minimaal één uur voor de call verspreid is aan de deelnemers. Dit besluit dient in de call van 08:00 uur te worden bekrachtigd.

Impact:

- a. Als C-ARM langere tijd offline is, wordt de weekend allocatie later opgeleverd.
- b. Indien er sprake is van uitstel, ontstaat er mogelijk ook ergens een ophoping van berichten. Hier zullen we ook rekening mee moeten houden.

2.4.4 Toetsingsmoment exit criteria (3): Zondag 19-03-2023; 16:00 uur door SI

Indien in toetsingsmoment 2 is besloten om de fallback voort te laten duren, dan zal op zondag 19 maart 2023 uiterlijk 16:00 uur een 3^e exit criteria toetsingsmoment plaatsvinden middels een conference call met de SI. *Indien mogelijk zal de call eerder plaatsvinden waarbij de eis is dat het advies vrijgave rapport minimaal één uur voor de call gedistribueerd is aan de deelnemers van de SI en de beschikbare leden akkoord gaan met een vervroegde vergadering.*

Op basis van de status van de software deployment Allocatie 2.0 Tranche 2 kan één van de volgende scenario's in werking treden:

Go Live

Indien de software Allocatie 2.0 Tranche 2 na de fallback verlenging succesvol is uitgerold zal het Go Live scenario in werking treden. De systemen worden weer beschikbaar gesteld op 19-03-2023 om 19:00 uur.

Fallback verlenging (tot aan besluit SSG)

Indien de exit criteria tijdens het derde toetsingsmoment op zondag 19-03-2023 16:00 uur niet behaald zijn, dan zal de besluitvorming over het te volgen scenario de verantwoordelijkheid worden van de SSG. De SSG zal de dag na het go-live weekeinde een vergadering beleggen om tot een nader besluit te komen.

De SSG kan besluiten tot Go Live, of een verdergaande fallback of zelfs een rollback. Tot aan de 9^e kalenderdag na het go-live weekeinde zal de SSG dagelijks een sessie beleggen waarin een scenario keuze plaatsvindt. Uiterlijk op de 9^e kalenderdag maakt de SSG zijn finale beslissing tot go live of roll back.

In de periode tussen de no-go op zondag 19-03-2023 16:00 uur en de besluitvorming van de SSG op maandag 20-03-2023 10.00 uur, zal er gewerkt worden aan een oplossing, echter er zal niet live gegaan worden, totdat de SSG een go gegeven heeft.

Impact:

- a. Als C-ARM langere tijd offline is, wordt de weekend allocatie later opgeleverd.
- b. Indien er sprake is van uitstel, ontstaat er mogelijk ook ergens een ophoping van berichten. Hier zullen we ook rekening mee moeten houden.
- b. Een uitstel van de functionele Go-Live heeft impact op de inkoopposities en financiële gevolgen van/voor BRPs en RNBs (netverlies).

2.4.5 SSG besluitvorming

Vanaf het go-live weekeinde waarin binnen het vooraf bepaalde window niet succesvol live is gegaan, neemt de SSG besluitvorming t.a.v. go-live, fallback of rollback, over van de SI. De SSG overlegt en besluit dagelijks welk scenario gevolgd zal worden.

Go Live

Indien de software na de Fallback verlenging succesvol is uitgerold zal het Go Live scenario in werking treden. De systemen worden weer beschikbaar gesteld voor de sector op een datum en tijdstip dat door de SSG bepaald wordt.

Fallback verlenging SSG

Indien de exit criteria tijdens de besluitvorming op maandag, na de fallback verlenging, niet behaald worden, dan kan de SSG besluiten de fallback periode verder te verlengen tot aan de volgende SSG meeting, waarin vervolgens opnieuw een scenario keuze gemaakt zal worden.

Impact:

- a. Als C-ARM langere tijd offline is, wordt de weekend allocatie later opgeleverd.
- b. Indien er sprake is van uitstel, ontstaat er mogelijk ook ergens een ophoping van berichten. Hier zullen we ook rekening mee moeten houden.

Rollback

Indien de vooruitzichten voor het oplossen van de issues in de fallback verlenging en een eventuele verdere verlenging daarvan niet positief zijn, kan door de SSG het besluit genomen worden om het rollback scenario in werking te laten treden. De doorlooptijd van een centrale rollback is 16 uur. Uitgangspunt is dat marktpartijen een decentrale rollback ook binnen 16 uur kunnen uitvoeren.

De release van de software wordt met een kleine maand uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke release datum. De functionele Go Live van IC256, IC273 en IC276 verplaatst tevens naar 1 mei 2023.

Impact:

- a. Als C-ARM langere tijd offline is, wordt de weekend allocatie later opgeleverd.
- b. Indien er sprake is van uitstel, ontstaat er mogelijk ook ergens een ophoping van berichten. Hier zullen we ook rekening mee moeten houden.
- c. Een uitstel van de functionele Go-Live heeft impact op de inkoopposities en financiële gevolgen van/voor BRPs en RNBs (netverlies).

2.4.6 Scenario overzicht

In onderstaande tabel is aangegeven welke scenario's mogelijk zijn en wanneer deze kunnen optreden, als ook wie verantwoordelijk is voor de besluitvorming daaromtrent.

Scenario	Wanneer	Wie besluit	Mogelijk vervolg scenario
Besluitvorming entry criteria	Vr 17-03-2023 10:00	SI	Go of 1 week uitstel
Besluitvorming exit criteria (1)	Za 18-03-2023 17:30	SI	Go live, systemen 20:00 beschikbaar of Fallback
Besluitvorming exit criteria (2)	Zo 19-03-2023 08:00	SI	Go live, systemen 11:00 beschikbaar of Fallback verlenging
Besluitvorming exit criteria (3)	Zo 19-03-2023 16:00	SI	Go live, systemen 19:00 beschikbaar of Fallback verlenging
Besluitvorming (dagelijks)	Ma 20-03-2023 10:00 tot di 28-03-2023	SSG MFF BAS	Go live, verlenging fallback of rollback
Besluitvorming (definitief)	Di 28-03-2023 tot go-live of Rollback	SSG MFF BAS	Go live of Rollback

2.5 Deployment Releases Allocatie 2.0 Tranche 2 Livegang 2 (31 maart tot 2 april 2023)

Binnen het project Allocatie 2.0 Tranche 2 vindt het Go Live Window plaats op zaterdag 1 april 2023 van 23:59 tot 00:00 uur. Dit Go Live Window kent een fallback scenario met voor de SI een aantal toetsingsmomenten. Daarna vindt besluitvorming plaats door de SSG.

Voorafgaand aan de deployment vindt een besluitvorming plaats op basis van de afgesproken entry criteria. Aansluitend aan de deployment of een fallback window, vindt besluitvorming plaats op basis van de afgesproken exit criteria.

2.5.1 Toetsingsmoment entrycriteria: Vrijdag 31-03-2023; 10:00 uur door SI

In de SI op vrijdag 31 maart besluit de Stuurgroep voor de start van de deployment van Allocatie 2.0 Tranche 2 op basis van het vrijgave advies dat gebaseerd is op de afgesproken en vooraf goedgekeurde entry & exit criteria.

Uitgangspunt hierbij is een ongewijzigde situatie – er zijn geen wijzigingen meer doorgevoerd in de centrale systemen - sinds de door de SSG gegeven Go Live op basis van het behalen van een positief advies van de SI op de volgende criteria:

- Positief advies Kopgroep
- Positief advies GAT
- 100% market readiness voor markttrollen LNB-E,RNB en FNB
- Market readiness voor tenminste 2 deelnemende leveranciers voor de aanlevering van geaggregeerde datasets ten behoeve van de berekening van dynamische profielfracties
- Succesvolle kwalificatie van tenminste 2 deelnemende leveranciers voor de aanlevering van geaggregeerde datasets ten behoeve van de berekening van dynamische profielfracties

Indien er een bevestiging van de Go wordt afgegeven worden de reeds in het weekend van 17 – 19 maart 2023 geïmplementeerde technische wijzigingen functioneel live gebracht op ***zaterdag 1 april 2023 tussen 23:59 en 00:00 uur.***

Indien er een No-go wordt afgegeven zal de start van de deployment met 1 maand worden uitgesteld ***naar 1 mei 2023***, dit betreft de functionele Go Live van IC256, IC273 en IC276.

Go Live

Indien de software succesvol is uitgerold, i.e. aan de exitcriteria is voldaan, zal het Go Live scenario in werking treden.

2.5.2 Scenario overzicht

In onderstaande tabel is aangegeven welke scenario's mogelijk zijn en wanneer deze kunnen optreden, als ook wie verantwoordelijk is voor de besluitvorming daaromtrent.

Scenario	Wanneer	Wie besluit	Mogelijk vervolg scenario
Besluitvorming entry criteria	Vr 31-03-2023 10:00	SI	Go of 1 maand uitstellen
Besluitvorming exit criteria	Za 01-04-2023 09:00	SI	Go live
